


Planning du projet / Mise à jour Mai 2010

Sous réserve de modifications liées aux aléas des chantiers

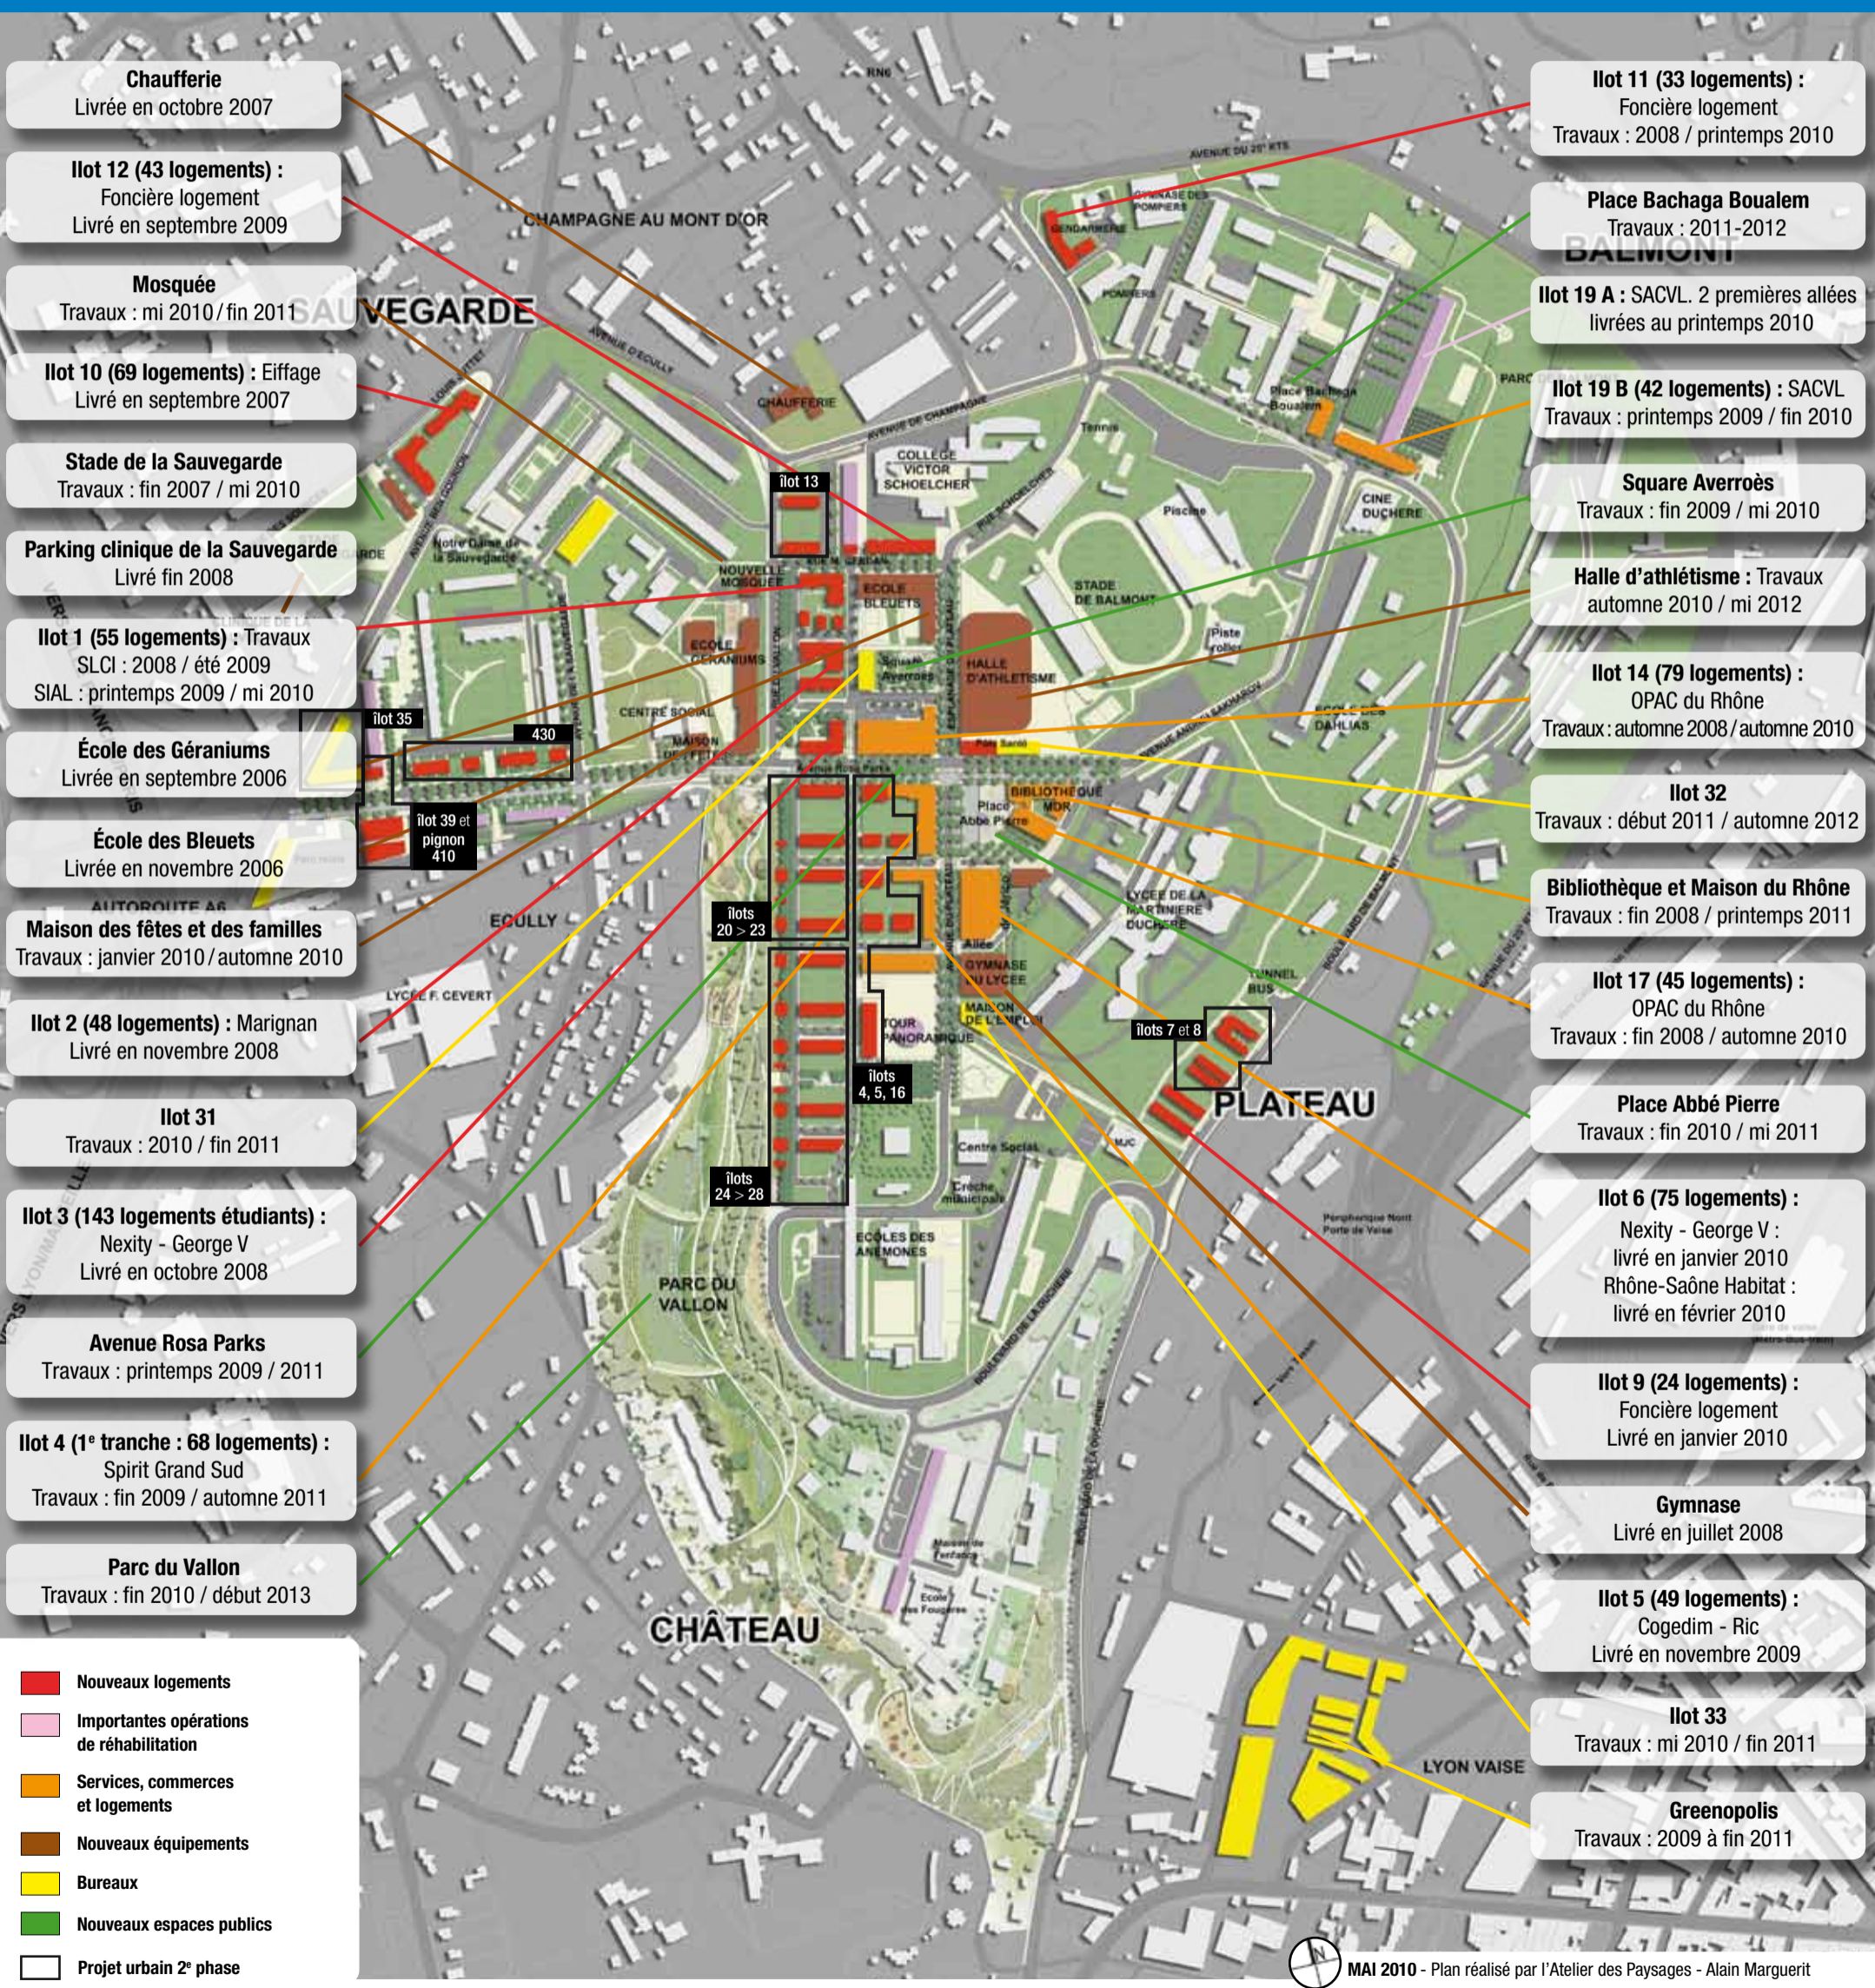

Chaufferie
Livrée en octobre 2007

Ilot 12 (43 logements) :
Foncière logement
Livré en septembre 2009

Mosquée
Travaux : mi 2010 / fin 2011

Ilot 10 (69 logements) : Eiffage
Livré en septembre 2007

Stade de la Sauvegarde
Travaux : fin 2007 / mi 2010

Parking clinique de la Sauvegarde
Livré fin 2008

Ilot 1 (55 logements) : Travaux
SLCI : 2008 / été 2009
SIAL : printemps 2009 / mi 2010

École des Géraniums
Livrée en septembre 2006

École des Bleuets
Livrée en novembre 2006

Maison des fêtes et des familles
Travaux : janvier 2010 / automne 2010

Ilot 2 (48 logements) : Marignan
Livré en novembre 2008

Ilot 31
Travaux : 2010 / fin 2011

Ilot 3 (143 logements étudiants) :
Nexity - George V
Livré en octobre 2008

Avenue Rosa Parks
Travaux : printemps 2009 / 2011

Ilot 4 (1^{re} tranche : 68 logements) :
Spirit Grand Sud
Travaux : fin 2009 / automne 2011

Parc du Vallon
Travaux : fin 2010 / début 2013

Ilot 11 (33 logements) :
Foncière logement
Travaux : 2008 / printemps 2010

Place Bachaga Boualem
Travaux : 2011-2012

Ilot 19 A : SACVL. 2 premières allées
livrées au printemps 2010

Ilot 19 B (42 logements) : SACVL
Travaux : printemps 2009 / fin 2010

Square Averroès
Travaux : fin 2009 / mi 2010

Halle d'athlétisme : Travaux
automne 2010 / mi 2012

Ilot 14 (79 logements) :
OPAC du Rhône
Travaux : automne 2008 / automne 2010

Ilot 32
Travaux : début 2011 / automne 2012

Bibliothèque et Maison du Rhône
Travaux : fin 2008 / printemps 2011

- Nouveaux logements
- Importantes opérations de réhabilitation
- Services, commerces et logements
- Nouveaux équipements
- Bureaux
- Nouveaux espaces publics
- Projet urbain 2^e phase

Ilot 11 (33 logements) :
Foncière logement
Travaux : 2008 / printemps 2010

Place Bachaga Boualem
Travaux : 2011-2012

Ilot 19 A : SACVL. 2 premières allées
livrées au printemps 2010

Ilot 19 B (42 logements) : SACVL
Travaux : printemps 2009 / fin 2010

Square Averroès
Travaux : fin 2009 / mi 2010

Halle d'athlétisme : Travaux
automne 2010 / mi 2012

Ilot 14 (79 logements) :
OPAC du Rhône
Travaux : automne 2008 / automne 2010

Ilot 32
Travaux : début 2011 / automne 2012

Bibliothèque et Maison du Rhône
Travaux : fin 2008 / printemps 2011

Ilot 17 (45 logements) :
OPAC du Rhône
Travaux : fin 2008 / automne 2010

Place Abbé Pierre
Travaux : fin 2010 / mi 2011

Ilot 6 (75 logements) :
Nexity - George V :
livré en janvier 2010
Rhône-Saône Habitat :
livré en février 2010

Ilot 9 (24 logements) :
Foncière logement
Livré en janvier 2010

Gymnase
Livré en juillet 2008

Ilot 5 (49 logements) :
Cogedim - Ric
Livré en novembre 2009

Ilot 33
Travaux : mi 2010 / fin 2011

Greenopolis
Travaux : 2009 à fin 2011
